ID.2025_85 LAVORI PER IL RIPRISTINO DI ZONE UMIDE NEL PARCO DEL BEIGUA, LOTTO 2 AREA MONTEROSSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CRATER" PNRR M4-C2-I1. 4 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP D41G23000440002 - CIG B7BED24BB0.

Relazione Finale e Certificato di Regolare esecuzione

Impresa: NEVLEI di TRAVO DANIELE VIA VALLE GARGASSA 5 - 16010 - ROSSIGLIONE (GE)

P.IVA 02789290992 Rea: 514286
il cui legale rappresentante è _TRAVO DANIELE codice fiscale TRVDNL96D09D969Z Telefono+39 347 408 6728
posta elettronica _ travo.nevlei@pec.it

Affidamento/Contratto: Determinazione n. 2555/2025

Progetto:	
Importo esecuzione delle lavorazioni	5.917,14€
di cui per il costo della manodopera	4.998,93 €
Importo costi della sicurezza	913,72 €

Contratto:	
Importo esecuzione delle lavorazioni	5.621,28 €
di cui per il costo della manodopera	4.998,93 €
Importo costi della sicurezza	913,72 €
Totale imponibile	6.535,00 €
IVA al 22%	1.437,70 €
TOTALE lavori (oneri fiscali inclusi)	7.972,70 €

Committente:	Città Metropolitana di Genova
Progettista:	dott. agr. Paolo Derchi
Direttore dei Lavori:	dott. agr. Paolo Derchi
Responsabile del procedimento	dott. ssa Franca Stragapede

Il giorno 14 ottobre 2025, visto il Verbale di Consegna in data 01 del mese di ottobre dell'anno duemilaventicinque .

Considerato che i lavori in forza del capitolato e contratto dovevano essere compiuti in 20 giorni naturali successivi e continui.

Viste le risultanze dei sopralluoghi in cantiere effettuati successivamente alla Consegna.

Il sottoscritto dott. agr. Paolo Derchi in qualità di direttore dei lavori certifica il completamento degli stessi in tempo utile contrattuale.

RELAZIONE AL CONTO FINALE

Assuntore dei lavori: i lavori furono affidati a ditta NEVLEI di TRAVO DANIELE VIA VALLE GARGASSA 5 - 16010 - ROSSIGLIONE (GE) – importo dei lavori 6.535,00 euro

Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti 20 giorni consecutivi, naturali a partire dalla data dell'inizio dei lavori. Il termine utile massimo dei lavori fu fissato non oltre il 20 ottobre 2025

Proroghe concesse: durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Sospensioni: non furono emessi verbali di sospensione lavori

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non vennero accertati danni di forza maggiore.

Perizie suppletive e di variante: non furono redatte perizie di variante.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Variazioni apportate: durante il corso dei lavori sono state prescritte variazioni ad aspetti di dettaglio

Certificati di acconto: non furono emessi certificati di acconto

Riserve dell'Impresa: l'Impresa firma il presente certificato senza riserve.

Infortuni sul lavoro: durante il cantiere l'Impresa non ha comunicato infortuni sul lavoro, né la D.L. ha rilevato in occasione delle visite accadimenti di specie.

Direzione dei Lavori: i lavori sono stati diretti dal dott. agr. Paolo Derchi iscritto con il n. 7 all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Liguria, con studio in Genova

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori con la scorta della perizia originale, nonché degli atti contabili, avendo provveduto alla ricognizione dei lavori in contraddittorio con l'Impresa e verificato che i lavori corrispondono alle previsioni degli atti progettuali ed alle indicazioni di dettaglio fornite e che furono eseguiti a regola d'arte secondo le prescrizioni contrattuali che per quanto è stato possibile accertare con riscontri lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle prescrizioni degli atti progettuali e contabili

- che l'importo dei lavori non supera quello delle somme autorizzate
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile sul tempo contrattuale
- che non è avvenuto alcun infortunio sul lavoro
- che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'Assicurazione degli operai come da dichiarazioni allegate acquisite dall'Ente Appaltante
- che l'Impresa ha firmato senza riserva
- **che attesa la natura dei lavori (ripristino invaso area umida) la Ditta è stata informata dalla D.L. che, necessitando un periodo di assestamento delle opere (monitoraggio delle condizioni di stagnezza dei contrafforti in terra di riporto sul lato a valle) la stessa è tenuta ad effettuare , a seguito di monitoraggio**

periodico, le opere necessarie a garantire la funzionalità dell'invaso e la conservazione per il periodo necessario a considerare l'opera efficace e completa dal punto di vista della tenuta delle sponde alle temporanee infiltrazioni.
La Ditta, nell'ambito del periodo di garanzia, si dichiara edotta ed accetta l'impegno al monitoraggio ed ai necessari lavori di manutenzione.
La D.L. si dichiara disponibile per le indicazioni di cantiere eventualmente necessarie.

CERTIFICA

che i lavori ID.2025_85 LAVORI PER IL RIPRISTINO DI ZONE UMIDE NEL PARCO DEL BEIGUA, LOTTO 2 AREA MONTEROSSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CRATER" PNRR M4-C2-I1. 4 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP D41G23000440002 - CIG B7BED24BB0.
assunti dalla ditta NEVLEI di TRAVO DANIELE VIA VALLE GARGASSA 5 - 16010 - ROSSIGLIONE (GE) – importo dei lavori 6.535,00 euro sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo il quale risulta dal conto finale in netti

	€	6.535,00
da cui sono dedotti:		
per certificati d'acconto	€	0,00
per anticipazioni	€	0,00
per ritenute	€	0,00
per penale per ritardo esecuzione lavori	€	0,00
Totale deduzioni	€	0,00
Secondo lo stato finale il credito netto è pari a	€	6.535,00

diconsi euro *seimilacinquecentotrentacinque/00* che può quindi essere pagata alla ditta NEVLEI di Travo Daniele, a saldo di ogni suo avere previa approvazione del presente atto ed accertamento della regolarità contributiva.

Fatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto.

14 ottobre 2025

L'impresa appaltatrice

DOTT. DERGO PAOLO N. 7

Il direttore dei lavori

VISTO il RUP

DETTAGLIO dei lavori effettuati

Opere previste a progetto:

- Recupero dell'area umida ripristinando porzioni di habitat idonei ad ospitare popolazioni riproduttive di *Triturus carnifex, Triturus alpestris apuanus e Triturus vulgaris meridionalis*.
- Sterro in corrispondenza della depressione con approfondimento fino a circa 50/80 cm con eliminazione dei materiali terrosi
- Pareggiamento del fondo e formazione contrafforti di sponda lato nord lungo strada con il materiale escavato
- Raccolta e conservazione preliminare delle zolle erbose per il successivo impiego a copertura delle sponde terrose
- Modellamento manuale riporti e contrafforti e formazione scoli, troppo pieno
- Realizzazione opere accessorie : recinzione in legno a due correnti paralleli.

Opere realizzate:

- Recupero dell'area umida ripristinando porzioni di habitat idonei ad ospitare popolazioni riproduttive di *Triturus carnifex, Triturus alpestris apuanus e Triturus vulgaris meridionalis*.
- Sterro in corrispondenza della depressione con approfondimento fino a circa 50/80 cm con eliminazione dei materiali terrosi : **dettaglio opere in più**

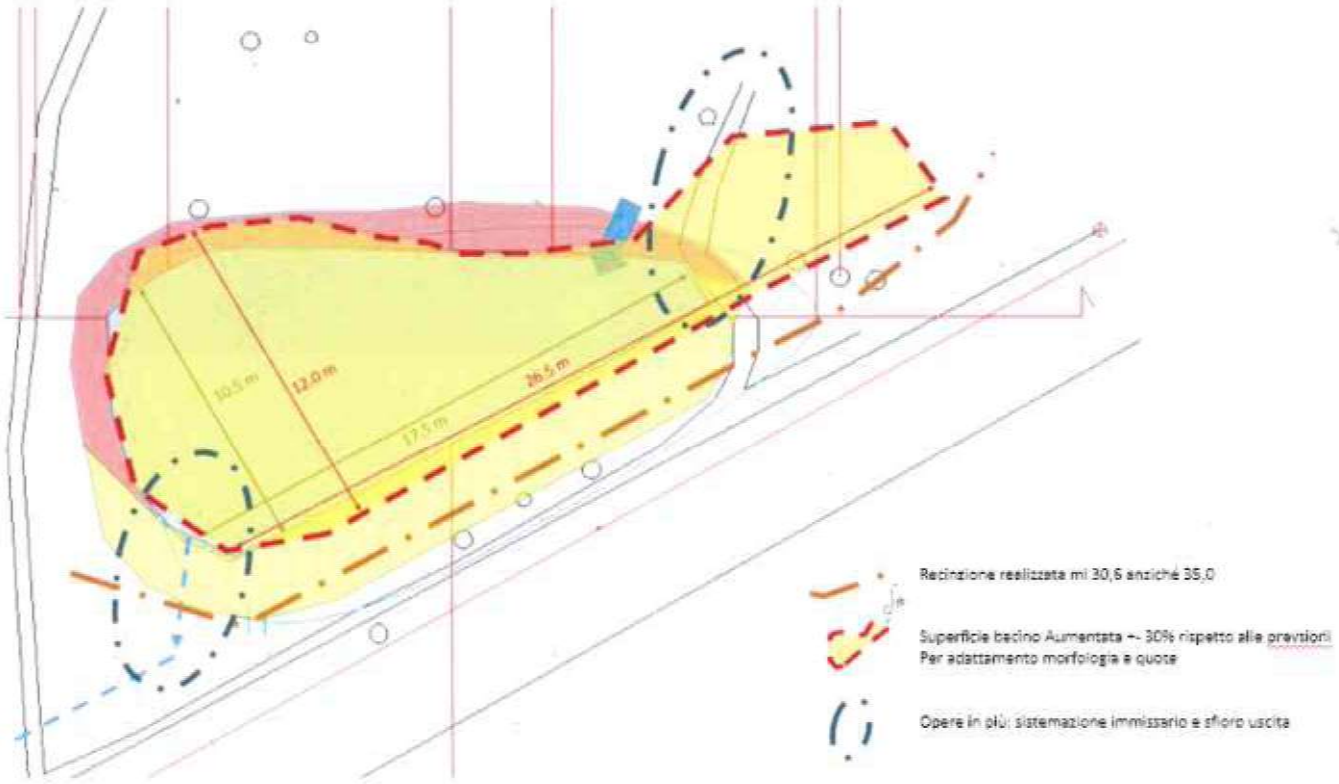

- Pareggiamento del fondo e formazione contrafforti di sponda lato nord lungo strada con il materiale

escavato

- Raccolta e conservazione preliminare delle zolle erbose per il successivo impiego a copertura delle sponde terrose : **opere in più fornitura e spargimento fiorume (da Arrenatereto – praterie da fieno da bassa altitudine)**
- Modellamento manuale riporti e contrafforti e formazione scoli, troppo pieno : **opere in più rivestimento sfioro troppo pieno con pietrame e sistemazione morfologica immissario**

▪ Realizzazione opere accessorie : recinzione in legno a due correnti paralleli. : **opere in meno 30.6 ml anziche 35,0 ml**

Considerato il valore in meno (4,4 ml in meno di recinzione per euro 69,58 al ml =306,15) e le opere in più (ampiezza bacino, sistemazione emissario ed immissario, fornitura e spargimento fiorume) si certifica la corrispondenza del computo preventivo e consuntivo.

Il direttore dei lavori

VISTO il RUP
